

澆置紀錄

工程名稱：Example Construction Project — Long Projec...

施工日期：2026-08-11

施工廠商：○○營造股份有限公司

填表人：Site Engineer

公單元 | 21


壁體資訊								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

單元類型	樁 / 壁編號	順序編號	混凝土強度(kgf/cm²)	設計深度(GL,m)	壁厚 / 單元長度(m)	澆置頂端高程(GL,m)	設計澆置高度(m)	設計 / 實際數量(m³)
公單元	21	03	350	GL -35.8 m	1 / 0.8	GL -0.5	35.30	28.24 / 30.5

澆置主控摘要			
--------	--	--	--

車次(車)	逐車累積量(m³)	設計 / 實際數量(m³)	預估 / 實測 / 差異(m)
16	112.00	28.24 / 30.5	140.00 / 33.60 / -106.40

澆置高度曲線

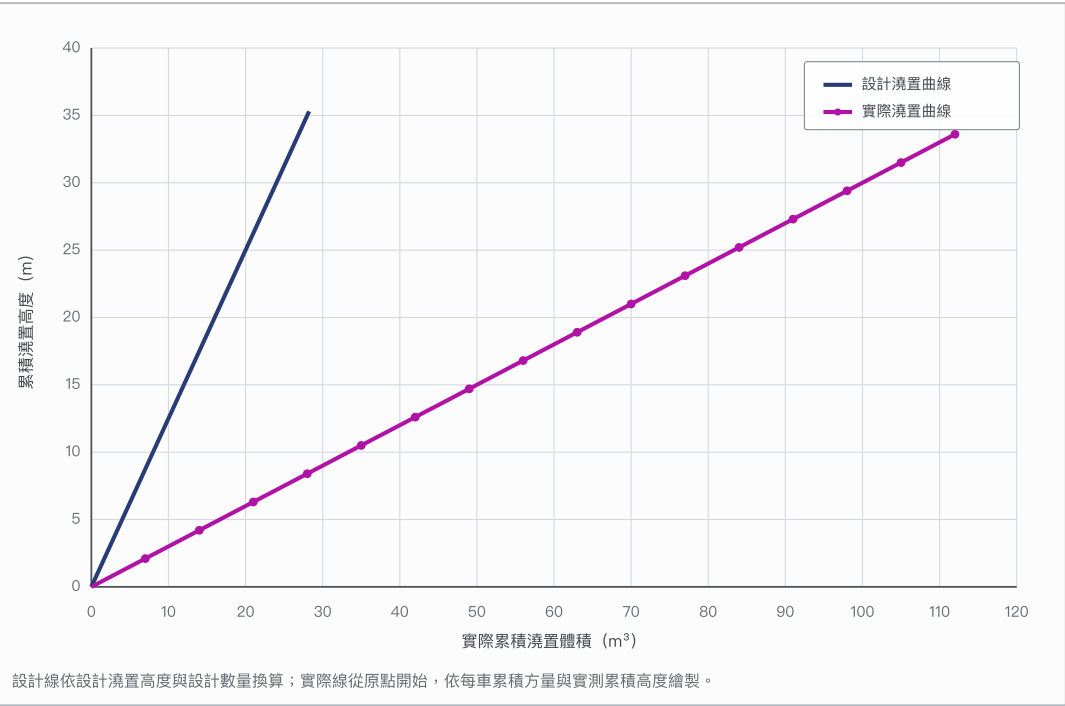

所長	副所長	擔當者

澆置紀錄

工程名稱：Example Construction Project — Long Projec...
施工廠商：○○營造股份有限公司

施工日期：2026-08-11
填表人：Site Engineer

逐車混凝土澆置紀錄								
車次	車號	卸料	結束	方量(m³)	累積(m³)	預估高度(m)	實測高度(m)	差異(m)
1	A-100	13:00	13:12	7.00	7.00	8.75	2.10	-6.65
2	A-101	13:15	13:27	7.00	14.00	17.50	4.20	-13.30
3	A-102	13:30	13:42	7.00	21.00	26.25	6.30	-19.95
4	A-103	13:45	13:57	7.00	28.00	35.00	8.40	-26.60
5	A-104	14:00	14:12	7.00	35.00	43.75	10.50	-33.25
6	A-105	14:15	14:27	7.00	42.00	52.50	12.60	-39.90
7	A-106	14:30	14:42	7.00	49.00	61.25	14.70	-46.55
8	A-107	14:45	14:57	7.00	56.00	70.00	16.80	-53.20
9	A-108	15:00	15:12	7.00	63.00	78.75	18.90	-59.85
10	A-109	15:15	15:27	7.00	70.00	87.50	21.00	-66.50
11	A-110	15:30	15:42	7.00	77.00	96.25	23.10	-73.15
12	A-111	15:45	15:57	7.00	84.00	105.00	25.20	-79.80
13	A-112	16:00	16:12	7.00	91.00	113.75	27.30	-86.45
14	A-113	16:15	16:27	7.00	98.00	122.50	29.40	-93.10
15	A-114	16:30	16:42	7.00	105.00	131.25	31.50	-99.75
16	A-115	16:45	16:57	7.00	112.00	140.00	33.60	-106.40

所長	副所長	擔當者
